

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA**

***AUDIÊNCIA PÚBLICA***

***CICLOVIA***

***19 DE ABRIL DE 2023***

EMPRESA  
CPS CONSTRUÇÃO, PROJETO E SINALIZAÇÃO –  
EIRELI

CONTRATO DE OBRA N° 078/2020  
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020

## ***OBJETO***

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CICLOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ANEXAS AO EDITAL.

## ***PRAZO***

6 (SEIS) MESES A PARTIR DA ORDEM DE INÍCIO.

## ***PREÇO***

**R\$ 1.212.619,49** (um milhão, duzentos e doze mil, seiscentos e dezenove reais com quarenta e nove centavos)

ORDEM DE INÍCIO DA OBRA: **29/12/2020**

Vigência: 60 (sessenta) dias da O.I.

ORDEM DE PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA: **23/03/2021**

JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

ORDEM DE REINÍCIO DA OBRA: **24/05/2021**

## ADITIVOS

*19/07/2021* – 1º Supressão de R\$ 226.079,05 e acréscimo de R\$ 216.456,32;

*11/08/2021* – 2º Prorrogação de prazo de contrato por mais 120 (cento e vinte) dias a contar de 29/08/2021;

*24/08/2021* – 3º Reequilíbrio Econômico de R\$ 94.453,26 referente a alteração de valores de insumos do pavimento de concreto simples.

*29/10/2021* – 4º Retificação de erro material cometido na transcrição do valor de Reequilíbrio Econômico para R\$ 96.453,26.

## PAGAMENTOS

1ª MEDIÇÃO – NF N° 43 – R\$ 81.717,95 (PERÍODO 29/12/20 À 23/02/2021)

**TOTAL R\$ 81.717,95** (pago em 10/06/2021)

2ª MEDIÇÃO – NF N° 54 – R\$ 86.166,81 (PERÍODO 24/02/21 À 28/06/2021)

**TOTAL R\$ 86.166,81**(pago em 15/07/2021)

3ª MEDIÇÃO – NF N° 09 – R\$ 199.232,26 (PERÍODO 26/06/21 À 13/08/2021)

**TOTAL R\$ 199.232,26** (pago em 08/09/2021)

REEQ.2ª MED NF N° 24 – R\$ 7.492,76 (PERÍODO 24/02/21 À 28/06/2021)

REEQ.3ª MED NF N° 25 – R\$ 24.028,34 (PERÍODO 26/06/21 À 13/08/2021)

REEQ.4ª MED NF N° 26 – R\$ 14.379,81 (PERÍODO 14/08/21 À 13/09/2021)

**TOTAL R\$ 45.900,91** (pago em 08/11/2021)

4ª MEDIÇÃO – NF N° 20 – R\$ 132.504,98 (PERÍODO 14/08/21 À 13/09/2021)

**TOTAL R\$ 132.504,98** (pago em 27/12/2021)

5ª MEDIÇÃO – NF N° 29 – R\$ 63.452,89 (PERÍODO 14/09/21 À 25/10/2021)

REEQ.4ª MED NF N° 30 – R\$ 3.219,00 (PERÍODO 14/09/21 À 25/10/2021)

**TOTAL R\$ 66.671,89** (pago 50% em 12/11/21 e 50% 16/11/21)

6ª MEDIÇÃO – NF N° 31 – R\$ 78.830,64 (PERÍODO 26/10/2021 À 05/11/2021)

REEQ. 6ª MED NF N° 32 – R\$ 13.010,98 (PERÍODO 26/10/2021 À 05/11/2021)

**TOTAL R\$ 91.841,62** (PAGO EM 03/01/23)

7ª MEDIÇÃO – NF N° 42 – R\$ 86.800,97 (PERÍODO 06/11/2021 À 17/02/2022)

REEQ.7ª MED NF N° 43 – R\$ 7.376,02 (PERÍODO 06/11/2021 À 17/02/2022)

**TOTAL R\$ 94.176,99 PENDENTE DE PAGAMENTO.**

OBS.: DOCUMENTO RECEBIDO EM 18/04/2022 NA SMSM E ARQUIVADO SEM ENCAMINHAMENTO PARA PAGAMENTO.

# AVISO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO MEMORANDO Nº 426/2022 SMPCR

## ATIVIDADES ENCERRADAS COM 60,57% DO OBJETO

TOTAL MEDIDO: 1ª à 7ª medição: R\$ 728.706,50

(sem incluir o reequilíbrio a partir da 2ª medição)

VALOR PAGO 1ª à 6ª medição: R\$641.905,53

Valor pago Reequilíbrio da 2ª à 6ª medição: R\$ 62.130,89

VALOR A PAGAR 7ª MEDIÇÃO R\$ 86.800,97

VALOR A PAGAR REEQ. 7ª MEDIÇÃO R\$ 7.376,02

# RELATÓRIO DO FISCAL DE CONTRATO: 07/04/2022

## MEMORANDO Nº376/2022 de 07/04/2022- SMPCR –

### INFORMA PONTOS QUE PRECISAM DE REPARO NA

# CICLOVIA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

#### Relatório

De: SMPCR  
Para: SMSM  
Data: 06/04/2022  
Assunto: Apresentação de pontos que necessitam de reforma na Obra da Ciclovia

Vimos, por meio desta, elencar alguns pontos que necessitam de reformas na Obra da Ciclovia na Av. Flores da Cunha no canteiro Central, contrato 078/2018 de responsabilidade da empresa CPS – CONSTRUÇÃO, PROJETO E SINALIZAÇÃO – EIRELI.

- 1 - Furo no concreto no rebaixo da passagem de pedestres, com exposição da Lona Plástica.  
Local – Altura do Nº 1788 da Av Flores da Cunha;
- 2 - Furos no concreto no rebaixo da passagem de água, com exposições da Lona Plástica.  
Local – Altura do Nº 1724 da Av Flores da Cunha;
- 3 - Furos no concreto no rebaixo da passagem de pedestres, com exposição da Lona Plástica.  
Local – Altura do Nº 1662 da Av Flores da Cunha;
- 4 - Furos no concreto no rebaixo da passagem de pedestres, com exposição da Lona Plástica.  
Local – Altura do Nº 1648 da Av Flores da Cunha;
- 5 - Placa de concreto levantada no rebaixo da passagem de pedestres.  
Local – Altura do Nº 1320 da Av Flores da Cunha;

Av Flores da Cunha nº 2209 – Centro – Cachoeirinha-RS CEP: 94950-000 – Cachoeirinha / RS –  
Fone / Fax: (51) 3471-2615 www.cachoeirinha.rs.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

- 6 – Furos e rachaduras no concreto no rebaixo da passagem de pedestres.  
Local – Altura do Nº 1210 da Av Flores da Cunha;
- 7 - Furos e rachaduras no concreto no rebaixo da passagem de pedestres.  
Local – Altura do Nº 1104 da Av Flores da Cunha;
- 8 – Realizar a desforma dos trechos que ainda existem formas de concretagem.
- 9 – Realizar retirada de materiais de obra da Ciclovia.

Estes pontos elencados devem ser refeitos de forma a evitar que tais problemas voltem a surgir, após a execução dos reparos a empresa deve solicitar à Prefeitura Municipal vistoria e aprovação dos serviços executados.

Fotos em anexo

*Marciano de Moraes*  
Eng. Marciano Freitas de Moraes  
SMPCR – matrícula 15456  
CREA- rs202387

Av Flores da Cunha nº 2209 – Centro – Cachoeirinha-RS CEP: 94950-000 – Cachoeirinha / RS –  
Fone / Fax: (51) 3471-2615 www.cachoeirinha.rs.gov.br

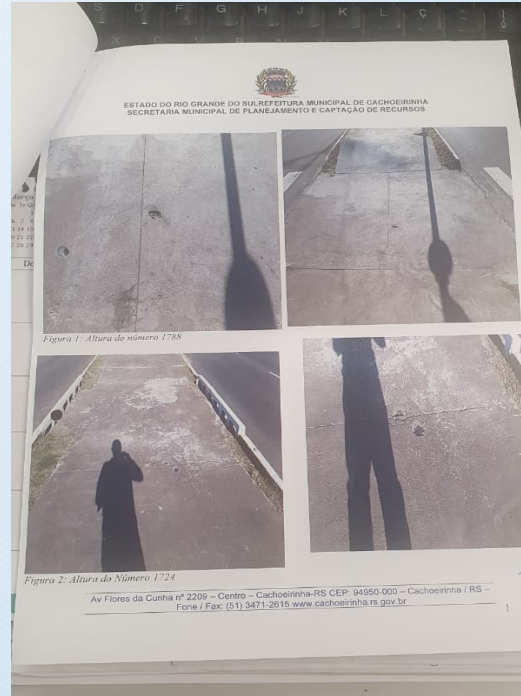


Figura 1: Altura do número 1788

Figura 2: Altura do Número 1724

Av Flores da Cunha nº 2209 – Centro – Cachoeirinha-RS CEP: 94950-000 – Cachoeirinha / RS –  
Fone / Fax: (51) 3471-2615 www.cachoeirinha.rs.gov.br



Figura 3: Altura do número 1320

Figura 6: Altura do número 1210

Av Flores da Cunha nº 2209 – Centro – Cachoeirinha-RS CEP: 94950-000 – Cachoeirinha / RS –  
Fone / Fax: (51) 3471-2615 www.cachoeirinha.rs.gov.br

- 16/12/2021 – Empresa enviou pedido de aditivo contratual de prorrogação de prazo.
- 01/02/2022 – SMSM encaminha solicitação de aditivo de prazo contratual.(Memo nº 301/2022)
- 04/02/2022 – Superintendência de compras informa impossibilidade de aditivo de prazo – contrato vencido em 29/12/2021.
- 09/02/2022 – SMSM Solicita orientações à PGM quanto à prorrogação de prazo e conclusão da obra.

- 08/06/2022 – Encaminhada resposta à PGM referente a solicitação do Ministério Público, incluindo Parecer Técnico do Engenheiro/Fiscal de Obra e Parecer do Departamento de Mobilidade sobre inviabilidade de utilização da obra para o fim que se destina;
- 22/11/2022 – Novo encaminhamento de resposta ao MP.

# RISCOS

DEZ/2022



# RISCOS

24/DEZ/2022



SUGESTÕES









